


Expertise

MARS 2012

1. Chaudière surdimensionnée

Raccorder de nouveaux consommateurs

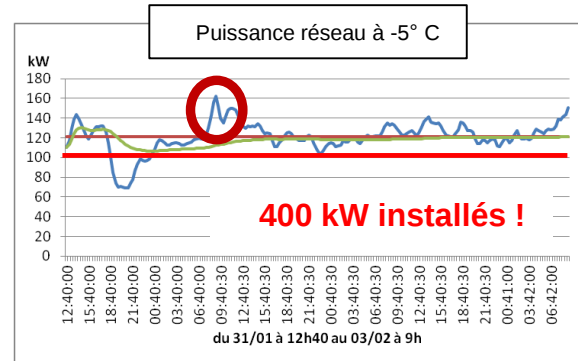

2. Surconsommation de mazout

Régulation pour inhiber la chaudière mazout

Période	Années	Jours	Production mazout (MWh)	Production Totale (MWh)	% prod mazout
du 9/01/09 au 13/01/10	en 2009	369	111	269	41,3%
du 15/12/11 au 2/10/12	en 2012	302	125,58	300,74	41,8%
du 2/10/12 au 1/10/13	en 2013	364	54,72	361,31	15,1%
du 1/10/13 au 2/10/14	en 2014	365	36,78	358,70	10,3%

3. Pertes du réseau de chaleur si fonctionnement en été

Régulation du réseau de chaleur pour réduire les pertes de 30% à 10% (phase 3)

4. Problèmes de conception hydraulique

Modification de l'hydraulique et ballon de stockage

Phase 1

2012-2014

Chantier Fin 2012

Inhibition de la chaudière mazout

Chantier 2013-2014

Raccordement de la **nouvelle école** sur le réseau de chaleur = **80 kW**




Phase 2

2014

Raccordement de la **Résidence Service** sur le réseau de chaleur = **150 kW**

Marché en 2 lots: pose du réseau de chaleur et raccordement Hydraulique

Mise en service planifiée pour novembre 2014

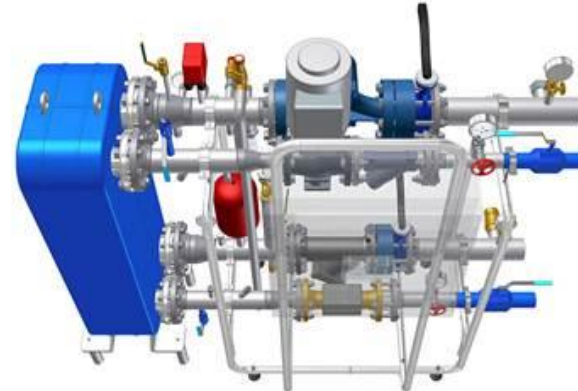

Phase 3

2015

Modification hydraulique de la chaufferie, **ballon de stockage 8m³** et **gestion technique centralisée**

Travaux planifiés en mars 2015

